



ADR CENTRU

Str. Decebal nr. 12, 510093 Alba Iulia

Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail: office@adrcentru.ro

ANALIZĂ **privind stadiul implementării POR 2007-2013 la nivelul** **Regiunii de Dezvoltare Centru la data de 31.08.2015**

Programul Operațional Regional implementează elemente importante ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Planului Național de Dezvoltare (PND), contribuind, împreună cu celelalte Programe Operaționale Sectoriale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a PND și al Cadrului Național Strategic de Referință, și anume diminuarea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și statele membre ale UE. Programul Operațional Regional a fost aprobat și a devenit operațional în 12 iulie 2007.

Programul Operațional Regional cuprinde 6 axe prioritare tematice la nivel național, și anume:

Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – potențiali poli de creștere

Axa 2 - Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport

Axa 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale

Axa 4 - Consolidarea mediului de afaceri regional și local

Axa 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului


Axa 6 - Asistență tehnică

Prin intermediul POR, 3,726 miliarde de euro sunt alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională pentru perioada 2007-2013. La acestea se adaugă contribuția națională (publică și privată) în valoare de 0,703 miliarde Euro, alocarea totală prin POR fiind de 4,437 miliarde de euro. Prin Decizia C(2013) 9772 final Comisia Europeană a aprobat realocarea către POR 2007-2013 a sumei de 240 milioane euro (contribuție FEDR), din care 140 milioane euro (contribuție FEDR) de la POS Transport 2007-2013, respectiv 100 milioane euro (contribuție FEDR) de la POS Mediu 2007-2013. Astfel alocarea POR 2007-2013 urcă la 3,966 miliarde euro (contribuție FEDR).

Regiunii Centru – județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu - i-a fost alocat un procent de 10,9 % din bugetul total. În conformitate cu adresa AMPOR 12909/29.04.2014 și a realocărilor din luna decembrie 2013, bugetul regional este de 485,66 mil euro (inclusiv DMI 5.3 administrat la nivel național) pentru perioada 2007-2013 din care 421,55 mil euro de la FEDR și bugetul de stat.

Până în data de **31 august 2015 au fost depuse un număr de 1200 proiecte la nivelul Regiunii Centru**, în valoare totală a sumei solicitate de **1.217,00 milioane euro (curs inforeuro iunie 2015 – 4,4435)**. Toate domeniile majore de intervenție au fost suspendate la data de 13.02.2015.

Situația proiectelor depuse se prezintă astfel:

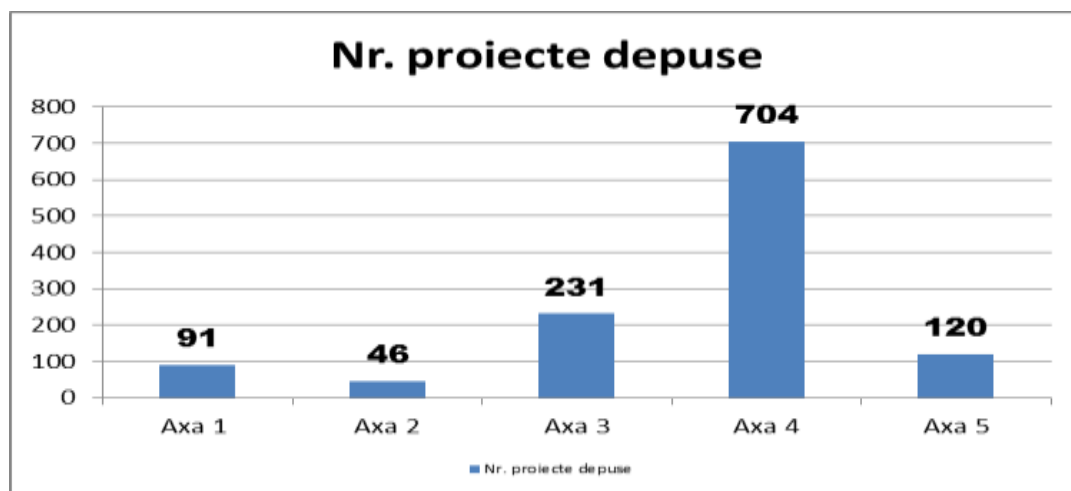

Situația proiectelor depuse pe axe prioritare și domenii majore de intervenție la nivelul Regiunii Centru la data de 31 august 2015:

Nr. Crt.	Domeniu major de intervenție	Suma alocată din POR la nivel regional - FEDR și buget de stat (mil. euro)	Proiecte depuse			Proiecte contractate			Proiecte în faza precontractuală			Proiecte în lista de rezervă			Proiecte rămase în evaluare		Nr. proiecte respinse		Buget rămas (mil. euro)	
			Nr. proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitată (mil. euro)	nr. proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitată (mil. euro)	nr. proiecte		Suma solicitată (mil. euro)
1	1.1	144,17	77	358,25	259,04	56	277,86	196,65									21	62,38	-52,48	
2	PC	74,30	35	178,33	122,05	26	144,55	94,98									9	27,08	-20,68	
3	PDU	29,72	15	75,18	57,55	12	49,55	37,20									3	20,34	-7,48	
4	CU	40,15	27	104,74	79,43	18	83,76	64,47									9	14,96	-24,32	
5	1.2	9,55	14	19,93	10,73	13	16,25	8,60									1	1,15	0,95	
6	2.1*	101,71	46	382,57	301,23	20	167,30	124,67			8	91,68	75,14				18	100,53	-98,10	
7	3.1*	24,72	14	38,00	29,62	12	36,28	28,22									2	1,39	-3,50	
8	3.2	10,31	51	32,93	25,88	24	15,88	12,31			2	1,19	0,95				25	12,62	-2,95	
9	3.3	10,31	3	14,78	12,02	3	14,78	12,02										0,00	-1,71	
10	3.4	28,86	104	152,07	120,75	29	48,09	36,97			52	72,56	58,42				23	25,35	-66,53	
11	3.4 - 2014	18,85	59	42,21	31,20	38	24,61	16,17									21	15,03	-2,68	
12	4.1	30,91	31	224,92	116,56	9	67,32	35,38									22	81,19	-4,47	
13	4.2	6,09	5	20,50	10,66	4	15,41	7,37									1	3,29	-1,28	
14	4.3	22,55	668	127,78	79,14	248	44,93	27,99									420	51,16	-5,44	
15	5.1	25,30	33	122,82	92,18	8	44,12	32,07			14	48,02	37,49				11	22,62	-44,26	
16	5.2	37,28	87	207,11	117,98	27	79,27	41,56									60	76,41	-4,28	
17	6.1	9,50	4	11,48	9,34	4	11,48	9,34									0	0,00	0,16	
18	6.2	0,50	4	0,84	0,66	4	0,84	0,66									0	0,00	-0,16	
TOTAL		480,61	1200	1.756,20	1.217,00	499	864,43	589,97	0	0,00	0,00	76	213,45	172,00	0	0,00	0,00	625	453,13	3,64

Notă:

- S-a folosit cursul inforeuro de la luna iunie 2015 – 1 eur = 4,4435 lei
- Proiectele din lista de rezervă sunt proiecte care au trecut de diferite faze ale procesului de evaluare și selecție, dar care nu se încadrează în sumele disponibile.
- La total buget disponibil sunt adunate doar sumele care mai sunt disponibile pe anumite axe prioritare nu sunt calculate și cele cu minus.
- * La DMI 2.1 și 3.1 sunt incluse și sumele alocate în cursul anului 2014

Situația proiectelor contractate la nivelul Regiunii Centru se prezintă la **31 august 2015** astfel:

Nr. Crt.	Domeniu major de intervenție	Suma alocată din POR la nivel regional - FEDR și buget de	Suma alocată din POR la nivel regional - FEDR (mil. euro)	Proiecte contractate		Proiecte finalizate		Proiecte reziliate		Valoare cereri de prefinanțare (mil. Euro)	Valoare FEDR+prefinanțare dedusă (mil. euro)	Valoare FEDR+BS+pref. dedusă (mil. Euro)	Grad de absorbție la plată FEDR+pref. dedusă %	Grad de absorbție la plată FEDR+BS+pref. dedusă %
				Nr. proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Suma rambursată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Suma solicitată (mil. euro)					
1	1.1	144,17	118,20	56	196,65	35	54,4	1	7,86	14,80	67,19	81,94	56,84	56,84
2	1.2	9,55	7,83	13	8,60					0,97	0,37	0,45	4,73	4,71
3	2.1*	101,71	89,96	20	124,67	11	54,01			23,06	73,12	82,84	81,28	81,45
4	3.1*	24,72	21,43	12	28,22	6	4,74			1,35	6,43	7,42	30,00	30,02
5	3.2	10,31	8,94	24	12,31	19	7,67			1,23	7,39	8,52	82,66	82,64
6	3.3	10,31	8,95	3	12,02	2	10,11			1,39	8,82	10,11	98,55	98,06
7	3.4	28,86	25,03	29	36,97	23	17,67			5,50	18,02	20,69	71,99	71,69
8	3.4 - 2014	18,85	16,35	38	16,17	2	0,16	2	0,26	0,00	1,75	2,01	10,70	10,66
9	4.1	30,91	27,64	9	35,38	6	20,65	1	7,93	1,82	19,78	22,69	71,56	73,41
10	4.2	6,09	5,45	4	7,37					0,03	1,96	2,19	35,96	35,96
11	4.3	22,55	20,16	248	27,99	194	21,16	46	4,83	1,05	21,52	22,06	106,75	97,63
12	5.1	25,30	23,35	8	32,07	5	16,76	1	4,02	5,70	17,35	19,97	74,30	78,93
13	5.2	37,28	34,38	27	41,56	12	11,67	2	1,14	3,19	19,87	20,32	57,80	54,51
14	6.1	9,50	7,13	4	9,34	3	5,07	0	0,00	1,09	6,22	8,29	87,30	87,26
15	6.2	0,50	0,38	4	0,66	3	0,45	0	0,00	0,09	0,45	0,81	120,00	122,00
TOTAL		480,61	415,17	499	589,97	321	224,52	53	26,04	61,27	270,24	310,11	65,09	64,52

Prin proiectele contractate în cadrul POR 2007-2013 se vor realiza următorii **indicatori**:

- ✚ Dezvoltare urbană pe baza planurilor integrate: 56 proiecte / 852.275 locuitori
- ✚ Peste 420 kilometri străzi reabilitați
- ✚ 3738 apartamente din Miercurea Ciuc, Târgu Mureș și Alba Iulia vor fi reabilitate
- ✚ 35 centre sociale reabilitate (+ 1 clădire cu 44 locuințe sociale)
- ✚ 79 școli reabilitate, cu peste 25000 elevi ; 9 școli dotate cu sisteme de siguranță și control
- ✚ 11 ambulatorii reabilitate și 1 Spital județean reabilitat și modernizat
- ✚ 90 unități de intervenție pentru situații de urgență (din care 19 ambulanțe)
- ✚ 11 structuri de sprijinire a afacerilor
- ✚ Peste 420 microîntreprinderi sprijinite
- ✚ 32 obiective de patrimoniu reabilitate, 10 unități de cazare modernizate, 15 structuri de agrement dezvoltate
- ✚ Peste 4200 locuri de muncă nou create

Sintetic situația proiectelor depuse precum și plățile efectuate pe fiecare axă prioritară a Programului, la data de 31.08.2015 se prezintă în felul următor:

	Axa 1	Axa 2	Axa 3	Axa 4	Axa 5	Axa 6	Total POR	
Suma alocată (mil. Euro)	153,72	101,71	93,05	59,55	62,58	10,00	480,61	
Proiecte depuse	Număr	91	46	231	704	120	8	1200
	Valoare sumă solicitată (mil. euro)	269,77	301,23	219,46	206,37	210,16	10,00	1.217,00
Proiecte contractate	Număr	69	20	106	261	35	8	499
	Valoare sumă solicitată (mil. euro)	205,25	124,67	105,68	70,74	73,63	10,00	589,97
	Procent din suma alocată %	133,52%	122,57%	113,57%	118,79%	117,66%	100,00%	122,75%
Proiecte în precontractual	Număr	0	0	0	0	0	0	0
	Valoare sumă solicitată (mil. euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți efectuate	Prefinanțare (mil. euro)	15,77	23,06	9,47	2,90	8,89	1,18	61,27
	Rambursare FEDR + BS + prefinanțare dedusă (mil. euro)	82,39	82,84	48,75	46,94	40,29	8,90	310,11
	Procent din suma alocată %	53,60%	81,45%	52,39%	78,82%	64,38%	89,00%	64,52%

✚ Din situația prezentată rezultă că până la data de 31 august 2015 au fost contractate un număr de 499 de proiecte care au o valoare totală a sumei solicitate de 589,97 mil. euro (122,75% din suma alocată).

✚ De asemenea, până în data de 31 august 2015, la nivelul Regiunii Centru s-au cheltuit **310,11** milioane euro, reprezentând **64,52%** din suma alocată la nivel regional pe Program.

Totodată, ținând seama de faptul că mai sunt foarte puține luni până la încheierea Programului Operațional Regional 2007-2013, AM POR a emis Instrucțiunea nr.134/2015 care stabilește calendarul pentru depunerea de către beneficiari a cererilor de plată, până cel târziu în 20 noiembrie 2015, precum și cel al cererilor de rambursare aferente cheltuielilor efectuate până la 31.12.2015, până cel târziu la 29 februarie 2016.

Probleme întâlnite în procesul de implementare a proiectelor în cadrul POR 2007-2013 și măsuri / propuneri de soluționare a acestora

I. Probleme întâlnite în procesul de implementare a proiectelor

Plecând de la gradul de absorbție de 64,52% și perioada rămasă până la finalul implementării Programului, ADR Centru a efectuat o inventariere a problemelor importante identificate pe parcursul derulării programului și anume:

1. Gradul de contractare:

Suma alocată: 480,61 milioane € FEDR + BS

Suma contractată: 589,97 milioane €

Teoretic gradul de contractare: 122,75%

Din analiza situației existente la 31.08.2015 rezultă un grad de contractare de 100,26%

1	FINANTARE NERAMBURSABILA conform contract de finantare si ADD (FEDR + BS) RON proiecte aflate in implementare	1.136.692.576,28
2	VALOARE CORECTII LA NERAMBURSABIL proiecte aflate in implementare	39.292.089,90
3	VALOARE NERAMBURSABILA SOLICITATA PROIECTE FINALIZATE	997.654.620
4	VALOARE REZILIA TE	115.708.740
5	Valoare nerambursabila AT	10,37 mil euro
	1-2+3	2.044.786.307,36 lei
		471.487.590,04 euro
	Suma alocata Regiunii Centru (cu asistenta tehnica)	480,61 mil euro
	Angajament fata de suma alocata cu asistenta tehnica	100,26 %

Datorita faptului ca pe parcursul implementării proiectelor contractate au apărut situații prin care au fost reziliate contracte; licitațiile pentru lucrări au fost adjudecate la valori cuprinse între 70-90% din valoarea cuprinsă în buget; în urma verificării procedurilor de achiziție au fost aplicate corecții financiare între 5-25 %; ADR Centru a întreprins o serie de demersuri către AM POR în vederea supracontractării proiectelor din listele de rezervă astfel:

- ✓ au fost întocmite situații cuprinzând stadiul contractării și implementării proiectelor din care rezultă valoarea actualizată a contractelor de finanțare ținând cont de valoarea contractelor de achiziție, a corecțiilor și a contractelor reziliate
- ✓ în urma analizării acestor situații, în cazurile în care au fost constatate sume disponibile în cadrul fiecărui DMI față de sumele alocate, au fost transmise la AMPOR solicitări pentru continuarea procesului de evaluare, selecție și contractare pentru cereri de finanțare aflate în lista de rezervă aferenta fiecărui DMI;
- ✓ astfel au fost semnate contracte de finanțare după cum urmează: pentru DMI 1.1 – 1 contract, pentru DMI 2.1. - 6 contracte, pentru DMI 3.1.- 6 contracte, pentru DMI 3.2.- 4 contracte, pentru DMI 3.4.- 6 contracte, pentru DMI 5.1- 3 proiecte.

De asemenea am solicitat supracontractarea până la procentul minim de 120 % având în vedere că implementarea era în proces de derulare și având în vedere situațiile enumerate mai sus să nu scădem cu procentul de contractare sub 100%. AM POR nu a aprobat toate solicitările ADR Centru motivând faptul că pentru depășirea alocării financiare este necesar avizul Ministerului Finanțelor, aviz care nu a fost obținut deoarece acest lucru influența angajamentele bugetare stabilite.


2. Analiză pe axe și DMI cu privire la gradul de absorbție și identificarea proiectelor cu risc:

A. În ce privește gradul de absorbție la nivelul Regiunii Centru situația se prezintă astfel:

- **DMI 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană** – 56,84% sub media pe POR Regiunea Centru, datorită faptului că acest DMI a fost lansat mai târziu decât celelalte, contractele sunt de valori mari, proiectele sunt complexe iar unii beneficiari întâmpină probleme în relația cu firmele de construcții

- **DMI 1.2. Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe** – 4,71% sub media pe POR Regiunea Centru datorită faptului că acest DMI a fost lansat mai târziu și au existat întârzieri în contractarea proiectelor
- **DMI 2.1. Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport** - 81,45% peste media pe POR Regiunea Centru
- **DMI 3.1. Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate** – 30,02% sub media pe POR Regiunea Centru datorită faptului că, în cadrul acestui DMI exista un proiect major - Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență “Dr. Fogolyan Kristof” – Sf. Gheorghe - care este întârziat.
- **DMI 3.2. Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale** – 82,64% peste media pe POR Regiunea Centru
- **DMI 3.3. Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență** – 98,06% peste media pe POR Regiunea Centru
- **DMI 3.4. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă** – 71,69% peste media pe POR Regiunea Centru
- **DMI 3.4. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă apel 2014** –10,66% sub media pe POR Regiunea Centru datorită faptului că acest DMI a fost lansat mai târziu; au existat proceduri de achiziții incorecte și unii beneficiari întâmpină probleme cu firmele de construcții
- **DMI 4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală** – 73,41% peste media pe POR Regiunea Centru
- **DMI 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea pentru noi activități** – 35,96% sub media pe POR Regiunea Centru datorită faptului că aceste proiecte presupun lucrări complexe de decontaminare care necesită timp mai îndelungat.
- **DMI 4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor** – 97,83% peste media pe POR Regiunea Centru
- **DMI 5.1. Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe** - 78,93% peste media pe POR Regiunea Centru
- **DMI 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice** – 54,51% sub media pe POR Regiunea Centru datorită faptului că în implementarea unor proiecte au intervenit neînțelegeri între beneficiar și firma de construcții
- **DMI 6.1 „Sprijinirea implementării, managementului și evaluării Programului Operațional Regional”** – 83,23% peste media pe POR Regiunea Centru
- **DMI 6.2 „Sprijinirea activităților de informare și publicitate pentru implementarea Programului Operațional Regional 2007-2013”** – 92,88 % peste media pe POR Regiunea Centru

Absorbția POR pentru Regiunea Centru este de 64,52%.

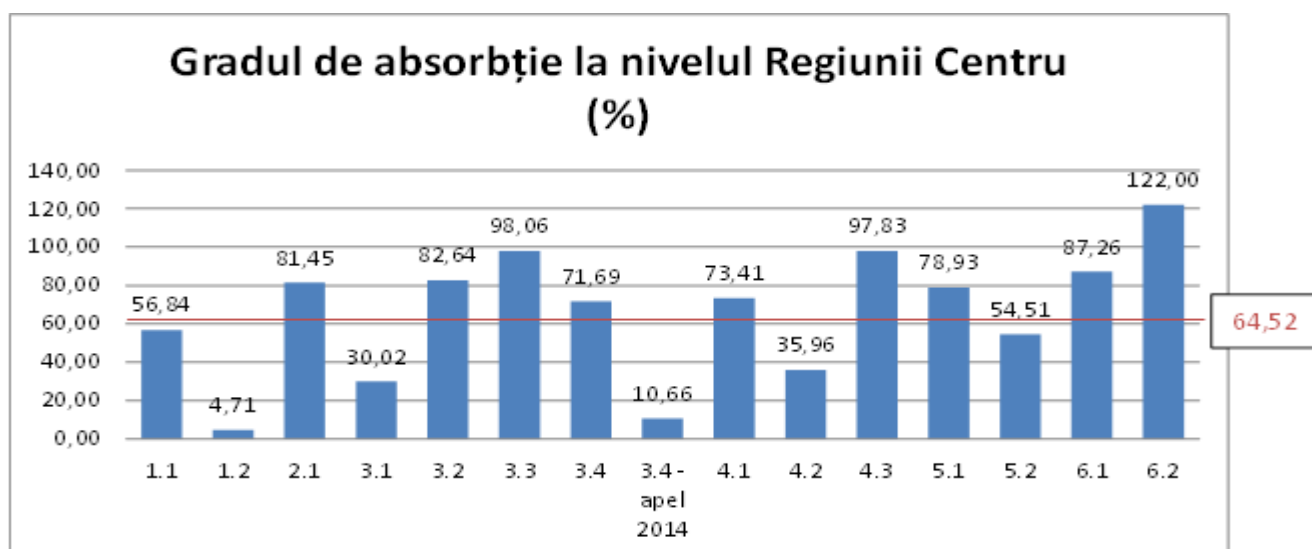

B. Având în vedere faptul că mai sunt doar 4 luni până la finalizarea programului, am efectuat o analiză a tuturor proiectelor axându-ne pe proiectele cu valori peste 5.000.000 lei. Situația pentru fiecare DMI se prezintă astfel:

DMI 1.1. – din 20 proiecte în implementare, 19 proiecte au valoarea peste 5.000.000 lei, din care 7 au gradul de absorbție între 0-5% astfel:

- Brașov – 6 proiecte
- Mureș - 1 proiect

DMI 1.2. – din 13 proiecte în implementare, 2 proiecte au valoarea peste 5.000.000 lei, din care 2 au gradul de absorbție între 0-5% astfel:

- Harghita – 1 proiect
- Mureș - 1 proiect

DMI 2.1. - din 9 proiecte în implementare, toate au valoarea peste 5.000.000 lei, din care 1 proiect are gradul de absorbție între 0-5%, astfel:

- Mureș - 1 proiect

DMI 3.1. – din 6 proiecte în implementare, 3 proiecte au valoarea peste 5.000.000 lei, din care 2 având gradul de absorbție între 0-5%, astfel:

- Mureș - 2 proiecte

DMI 3.2. – din 4 proiecte în implementare nici unul nu are valoarea peste 5.000.000 lei.

DMI 3.4. – din 43 proiecte în implementare, 6 proiecte au valoarea peste 5.000.000 lei, din care 1 proiect are gradul de absorbție între 0-5%, astfel:

- Covasna – 1 proiect

DMI 4.1. – din 2 proiecte în implementare, ambele au valoarea peste 5.000.000 lei, 1 proiect are gradul de absorbție între 0-5% astfel:

- Sibiu – 1 proiect

DMI 4.2. – din 8 proiecte în implementare, 2 proiecte au valoarea peste 5.000.000 lei.

DMI 5.1. - din 2 proiecte în implementare, 2 proiecte au valoarea peste 5.000.000 lei, 1 proiect are gradul de absorbție între 0-5% astfel:

- Sibiu – 1 proiect

DMI 5.2. – din 13 proiecte în implementare, 10 proiecte au valoarea peste 5.000.000 lei, din care 2 proiecte au gradul de absorbție între 0-5%, astfel:

- Covasna -1 proiect
- Sibiu – 1 proiect

Principalele probleme identificate la proiectele în implementare sunt:

- ❖ Întârzieri în derularea procedurilor de achiziții și încheierea contractelor
- ❖ Modificări ale proiectelor tehnice datorate neconcordanțelor cu realitatea din teren
- ❖ Întârzieri în execuție datorate neînțelegerilor dintre firma de construcții și proiectant respectiv beneficiar
- ❖ Firma de construcții aflată în procedura de insolvență sau faliment,
- ❖ Întârzieri în depunerea CR/CP datorită întârzierilor în depunerea facturilor la beneficiari.
- ❖ Sesizările venite din partea unor terțe persoane (fizice sau juridice) care conduc la suspiciuni de neregula/frauda fapt care implica după caz returnarea către beneficiar a cererilor de plata aflate în verificare respectiv sistarea verificării cererilor de rambursare sau aplicarea unor măsuri tranzitorii doar în cazul beneficiarilor publici.

II. Măsuri și propuneri de soluționare a problemelor întâlnite

În vederea soluționării problemelor identificate ADR Centru a întreprins unele **măsuri** după cum urmează:

- ✓ Analiza punctuală pe proiectele cu probleme în cadrul întâlnirilor organizate cu ofițerii de monitorizare și ofițerii financiari;
- ✓ Planificare de vizite speciale la sediul beneficiarului și la locul de implementare a proiectelor la care au fost invitați să participe pe lângă reprezentanții OI ADR Centru (ofițer monitorizare, ofițeri de verificare financiară, director OI), reprezentanții AMPOR și beneficiarul, reprezentantul legal al constructorului, dirigintele de șantier, proiectantul, managerul de proiect și alte persoane implicate în implementarea proiectului;
- ✓ Planificare de întâlniri la sediul ADR Centru sau AM POR cu echipele implicate în derularea proiectelor cu probleme;
- ✓ Transmiterea de scrisori de atenționare privind termenele de finalizarea a proiectelor conform Instrucțiunii 134/22.05.2015 privind termenele limita de depunere a Cererilor de rambursare și a Cererilor de plată în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2007-2013;
- ✓ Solicitarea graficelor de rambursare actualizate în funcție de graficele de execuție a lucrărilor pentru o estimare a sumelor ce urmează a fi solicitate la decontare lunar de către beneficiari.
- ✓ Propuneri privind înființarea de complete judecătorești specializate și stabilirea unei proceduri speciale cu termene reduse pentru soluționarea litigiilor născute în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene
- ✓ Propuneri privind modificarea sistemului achizițiilor publice
- ✓ Propuneri privind modificarea HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

**DIRECTOR GENERAL
SIMION CREȚU**
