

Programul Operațional Regional 2007-2013

Stadiul implementării în Regiunea de Dezvoltare Centru la 31.05.2015

Sovata, 23.06.2015



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

Proiecte depuse la nivelul Regiunii Centru - 31.05.2015

Nr. Crt.	Domeniu major de intervenție	Suma alocată din POR la nivel regional - FEDR și buget de stat (mil. euro)	Proiecte depuse			Proiecte contractate			Proiecte în faza precontractuală			Proiecte în lista de rezervă			Proiecte ramase în evaluare			Nr. proiecte respinse		Buget ramas (mil. euro)
			Nr. proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitată (mil. euro)	nr. proiecte	Valoare totală (mil. euro)	Suma solicitată (mil. euro)	nr. proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	
1	1,1	144,17	77	359,52	259,96	56	278,85	197,35										21	62,60	-53,18
2	PC	74,30	35	178,96	122,49	26	145,07	95,31										9	27,17	-21,01
3	PDU	29,72	15	75,45	57,76	12	49,72	37,34										3	20,41	-7,62
4	CU	40,15	27	105,12	79,71	18	84,06	64,70										9	15,01	-24,55
5	1,2	9,55	14	20,01	10,77	13	16,30	8,63										1	1,15	0,92
6	2,1*	101,71	46	383,92	302,30	20	167,89	125,11				8	92,01	75,41				18	100,88	-98,81
7	3,1*	24,72	14	38,13	29,72	12	36,41	28,32										2	1,39	-3,60
8	3,2	10,31	51	33,05	25,97	24	15,94	12,35				2	1,19	0,95				25	12,67	-2,99
9	3,3	10,31	3	14,83	12,06	3	14,83	12,06											0,00	-1,75
10	3,4	28,86	104	152,61	121,17	29	48,26	37,10				52	72,82	58,63				23	25,44	-66,87
11	3,4 - 2014	18,85	59	42,36	31,31	38	24,70	16,22										21	15,09	2,63
12	4,1	30,91	31	225,71	116,98	9	67,56	35,51										22	81,48	-4,60
13	4,2	6,09	5	20,57	10,70	4	15,46	7,40										1	3,30	-1,31
14	4,3	22,55	668	128,23	79,42	248	45,09	28,09										420	51,34	-5,54
15	5,1	25,30	33	123,25	92,51	8	44,28	32,19				14	48,19	37,62				11	22,70	-44,51
16	5,2	37,28	87	207,85	118,40	27	79,55	41,71										60	76,68	-4,43
17	6,1	9,50	4	11,52	9,38	4	11,52	9,38												0,12
18	6,2	0,50	4	0,85	0,67	4	0,85	0,67												-0,17
TOTAL		480,61	1200	1.762,43	1.221,32	499	867,50	592,07	0	0,00	0,00	76	214,21	172,61	0	0,00	0,00	625	454,73	3,55

* La DMI 2.1 și 3.1 sunt incluse și sumele alocate în cursul anului 2014

Curs inforEuro martie 2015: 1 eur. = 4,4278 lei

Situație plăți la nivelul Regiunii Centru - 31.05.2015

Nr. Crt.	Domeniu major de intervenție	Suma alocată din POR la nivel regional - FEDR și buget de stat (mil. euro)	Suma alocată din POR la nivel regional - FEDR (mil. euro)	Proiecte contractate		Proiecte finalizate		Proiecte reziliate		Valoare cereri de prefinantare (mil. Euro)	Valoare FEDR+prefinantare dedusă (mil euro)	Valoare FEDR+BS + pref. dedusă (mil. Euro)	Grad de absorbție la platit FEDR+pref. dedusă %	Grad de absorbție la platit FEDR+BS+pref. dedusă %
				Nr. proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Suma rambursată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Suma solicitată (mil. euro)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (12/4*100)	15 (13/3*100)
1	1,1	144,17	118,20	56	197,35	33	53,55	1	7,90	15,04	63,69	77,68	53,88	53,88
2	1,2	9,55	7,83	13	8,63					0,03	0,30	0,36	3,83	3,77
3	2,1*	101,71	89,96	20	125,11	11	54,20			23,18	72,24	81,84	80,30	80,46
4	3,1*	24,72	21,43	12	28,32	6	4,76			1,34	5,57	6,43	25,99	26,01
5	3,2	10,31	8,94	24	12,35	16	6,17			1,24	7,23	8,34	80,87	80,89
6	3,3	10,31	8,95	3	12,06	2	10,15			1,40	8,85	10,15	98,88	98,45
7	3,4	28,86	25,03	29	37,10	23	17,73			5,52	17,12	19,66	68,40	68,12
8	3,4 - 2014	18,85	16,35	38	16,22					0,00	0,38	0,44	2,32	2,33
9	4,1	30,91	27,64	9	35,51	6	20,72	1	7,96	1,83	19,94	22,87	72,14	73,99
10	4,2	6,09	5,45	4	7,40					0,03	1,83	2,05	33,58	33,66
11	4,3	22,55	20,16	248	28,09	192	20,91	45	4,76	1,05	21,49	22,03	106,60	97,69
12	5,1	25,30	23,35	8	32,19	5	16,82			5,72	17,20	19,78	73,66	78,18
13	5,2	37,28	34,38	27	41,71	11	11,55	2	1,15	3,20	18,61	18,97	54,13	50,89
14	6,1	9,50	7,13	4	9,38	3	5,09	0	0,00	1,10	6,06	8,08	85,05	85,05
15	6,2	0,50	0,38	4	0,67	3	0,45	0	0,00	0,09	0,44	0,58	117,33	116,00
TOTAL		480,61	415,17	499	592,07	311	222,10	49	21,76	60,77	260,95	299,26	62,85	62,27

* La DMI 2.1 și 3.1 sunt incluse și sumele alocate în cursul anului 2014

Curs inforEuro martie 2015: 1 eur. = 4,4278 lei

Axa 1 - Polul de creștere Brașov

- **Alocat** - 74,3 mil. Euro
- Lista include pentru Axa 1 POR 26 proiecte prioritare - 95,47 mil. Euro, din care:
 - **Depuse:** 26 proiecte - 95,31 mil. Euro - 128,28%, din care:
 - **Contractate:** 26 proiecte - 95,31 mil. Euro - 128,28%
 - Proiecte reziliate: 1 proiect - 7,94 milioane Euro
 - **Finalizate:**
 - 12 proiecte finalizate tehnic și financiar - 18,14 mil. Euro
 - **Sume plătite:**
 - Prefinanțare: 1,34 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 24,99 mil. Euro - 33,63%

POLUL DE CREȘTERE BRAȘOV - PROIECTE PRIORITARE
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, Axa I



Axa 1 - Poli de dezvoltare urbană

Sibiu

- **Alocat** - 14,86 milioane Euro, (12,18 mil. Euro din FEDR)
- PIDU include 8 proiecte individuale - 16,93 mil. Euro, din care:
 - **Contractate:** 8 proiecte - 16,93 mil. Euro - 113,93%
- **Finalizate:** 6 proiecte - 2,70 mil. Euro
- **Sume plătite:**
 - Prefinanțare: 0,75 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 6,10 mil. Euro - 41,05%

Tg. Mureș

- **Alocat** - 14,86 milioane Euro, (12,18 mil. Euro din FEDR)
- PIDU include 4 proiecte individuale - 20,42 mil. Euro, din care:
 - **Contractate:** 4 proiecte - 20,42 mil. Euro - 137,42%
- **Finalizate:** 3 proiecte - 10,31 mil. Euro
- **Sume plătite:**
 - Prefinanțare: 1,08 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 10,29 mil. Euro - 69,24%

Axa 1 - Centre urbane

- **Alocat** - 40,15 milioane Euro (36,56 mil. Euro din FEDR)
- **Depuse:** 9 PIDU cu 27 proiecte individuale - 79,71 mil. Euro
- **Selectate pentru finanțare:** 4 PIDU (Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Alba Iulia și Toplița) cu 18 proiecte individuale - 64,70 mil. Euro - 161,15%, din care:
 - **Contractate:** 18 proiecte - 64,70 mil. Euro - 161,15%
- **Finalizate:** 12 proiecte - 22,45 mil. Euro
 - 3 proiecte finalizate tehnic
- **Sume plătite:**
 - Prefinanțare: 11,87 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 36,30 mil. Euro - 90,41%

• *Prin proiectele contractate, se vor realiza următorii indicatori:*

- ✓ 127 de străzi în lungime de peste 80 km;
- ✓ 943 mii mp de căi de acces și pasaje modernizate;
- ✓ 35.086,23 mp de pista de biciclete construita;
- ✓ 64.139,50 mp de sistem pietonal construit;
- ✓ 22.453 mp spațiu degradat și neutilizat reabilitat;
- ✓ 5 stații capete de linie amenajate
- ✓ 353 locuri de parcare amenajate
- ✓ 6 parcări realizate cu 2259 de locuri
- ✓ 7 centre sociale modernizate și dotate;
- ✓ 1 clădire cu 44 locuințe sociale;
- ✓ 10 sisteme integrate de securitate pentru 10 unități de învățământ;
- ✓ 1 sistem de management informatizat al transportului în comun
- ✓ 1 sistem de monitorizare pentru siguranță cu 25 de camere de supraveghere
- ✓ 2 infrastructuri pentru activități socio-culturale reabilite/modernizate
- ✓ 9 școli dotate cu sisteme de siguranță și control
- ✓ 1 sistem de telegestiune a iluminatului public cu 10841 de stâlpi de iluminat, 1 centru de comandă și 65 de camere de supraveghere
- ✓ 2 centre de agrement amenajate
- ✓ 2 centre istorice reabilite
- ✓ 1 ascensor în plan înclinat cu o lungime de rulare de 165 ml, 2 stații, capacitate cabină de 18 persoane și capacitate persoane/zi - 648
- ✓ 2 structuri de afaceri construite în cadrul cărora se vor localiza 86 firme care vor crea 218 de noi locuri de muncă
- ✓ 80 de noi locuri de muncă create
- ✓ 922415 locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor din PIDU-ri.
- ✓ 3738 apartamente din Miercurea Ciuc, Târgu Mureș și Alba Iulia vor fi reabilite

Axa 1 - Proiecte finalizate



Municipiul Braşov- Reabilitare clădire cu destinaţie de locuinţe sociale în Municipiul Braşov

Parteneriat între Municipiul Braşov şi Comuna Vulcan- Centru Comunitar în Comuna Vulcan



Axa 1 - Proiecte finalizate



Municipiul Tîrgu Mureș - Modernizare rețea
stradală la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș

Municipiul Sibiu - Modernizare strada 9 Mai



Axa 1 - Proiecte finalizate

Asociația de dezvoltare intercomunitară Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov
- Achiziția și instalarea echipamentelor specifice pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în unitățile de învățământ și pe domeniul public din localitățile Codlea, Săcele, Râșnov, Predeal și Ghimbav



Axa 1 - Proiecte finalizate



Axa 1, DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

- **Lansat** în data de 02.11.2012 cu depunere începând din 03.12.2012
- **Alocat**: 87,60 milioane Euro din care 9,55 milioane Euro la nivel regional
- **Depuse**: 14 proiecte - 10,77 mil. Euro - 112,77%, din care:
 - **Contractate**: 13 proiecte - 8,63 mil Euro - 90,37%
 - **Respinse**: 1 proiect - 1,15 mil. Euro
- **Prin proiectele contractate, se vor realiza următorii indicatori:**
 - ✓ 3738 apartamente din Miercurea Ciuc, Târgu Mureș și Alba Iulia vor fi reabilitate

Axa 2 - Infrastructură de transport

- **Alocat** - 101,71 milioane Euro (89,6 milioane Euro din FEDR) - din care 8,06 milioane Euro respectiv 6,94 milioane Euro din FEDR au fost alocați în anul 2014
- **Depuse**: 46 proiecte - 302,30 mil. Euro - 297,22%, din care:
 - **Contractate**: 20 proiecte - 125,11 mil. Euro - 123,01%
 - **Lista de rezervă**: 8 proiecte - 75,41 mil. Euro
- **Sume plătite**:
 - Prefinanțare: 23,18 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 81,84 mil. Euro - 80,46%
- **Finalizate** - 11 proiecte tehnic și financiar cu o valoare de 54,20 mil. Euro
 - - 1 proiect finalizat tehnic
- **Prin proiectele contractate, se vor realiza următorii indicatori**:
 - ✓ 229,92 km drum județean reabilitat;
 - ✓ 6,43 km șosea de centura construită;
 - ✓ 54,67 km de străzi urbane reabilitate

Axa 2 - Infrastructură de transport - proiecte finalizate



Jud. Sibiu - Modernizare DJ 105G Sadu-Râu Sadului-Sădurel,
km 21+250-41+425

Axa 2 - Infrastructură de transport - proiecte finalizate



Municipiul Blaj, jud. Alba - Modernizare străzi urbane Tudor Vladimirescu și Mihail Kogălniceanu



Judetul Alba - Valorificarea potentialului turistic si economic al vail Aiud prin reabilitarea infrastructurii de transport DJ 107M



Municipiul Brașov - Varianta de ocolire a Mun. Brașov - Faza 1



Jud. Covasna - Reabilitare drum județean DJ 121 Covasna - Zăbala - Imeni - Catalina - Târgu Secuiesc, km. 32+000 - 49+100, județul Covasna

Axa 2 - Infrastructură de transport - proiecte finalizate



Jud. Sibiu - Modernizarea DJ 106 D Rășinari - Poplaca -
Orlat - intersecție DJ 106 E, km17+915 -31+727,
inclusiv pod la intersecția cu DJ 106 A



Jud. Mureș - Reabilitarea și modernizarea drumului județean
DJ 142C



Jud. Harghita - Reabilitare drum județean DJ 123A Tusnad -
Sâncrăieni km 0+000 - 14+600



Municipiul Tg. Mureș - Modernizare străzi în Municipiul
Tîrgu Mureș

Axa 3, DMI 3.1 - Infrastructură de sănătate

- **Alocat** - 24,72 milioane Euro (21,43 milioane Euro din FEDR) - din care 2,12 milioane Euro respectiv 1,83 milioane Euro din FEDR au fost alocați în anul 2014
- **Depuse:** 14 proiecte - 29,72 mil. Euro - 120,23%, din care:
 - **Contractate:** 12 proiecte - 28,32 mil. Euro - 114,56%
 - **Respinse:** 2 proiecte - 1,39 mil. Euro
- **Sume plătite:**
 - Prefinanțare: 1,34 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 6,43 mil. Euro - 26,01%
- **Finalizate** - 6 proiecte - tehnic și financiar - 4,76 mil. Euro
- **Prin proiectele contractate, se vor realiza următorii indicatori:**
 - ✓ 14 ambulatorii de specialitate reabilitate;
 - ✓ 1 spital județean reabilitat și dotat.

Axa 3, DMI 3.1 - Infrastructură de sănătate - proiecte finalizate

Județul Brașov - Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de obstetrică și ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov



Axa 3, DMI 3.1 - Infrastructură de sănătate - proiecte finalizate



Axa 3, DMI 3.2 - Infrastructură socială

- **Alocat** - 10,31 milioane Euro (8,94 milioane Euro din FEDR)
- **Depuse:** 51 proiecte - 25,97 mil. Euro - 251,89%, din care:
 - **Contractate:** 24 proiecte - 12,35 mil. Euro - 119,79%
 - **Lista de rezervă:** 2 proiecte - 0,95 mil. Euro
- **Sume plătite:**
 - Prefinanțare: 1,24 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 8,34 mil. Euro - 80,89%
- **Finalizate** - 16 proiecte - tehnic și financiar- 6,17 mil. Euro
 - 4 proiecte finalizate tehnic

Prin proiectele contractate, se vor realiza următorii indicatori:

- ✓ 7 centre sociale pentru persoane cu dizabilități, reabilite;
- ✓ 10 centre sociale rezidențiale pentru persoane în vârstă, modernizate;
- ✓ 1 centru multifuncțional pentru tineret, renovat și dotat;
- ✓ 2 creșe și o casă pentru copii reabilite;
- ✓ 3 centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, renovate și dotate;
- ✓ 2 centre medico-sociale modernizate;
- ✓ 2 centre de plasament modernizate;
- ✓ 4.234 persoane care beneficiază de infrastructura de servicii sociale modernizată

Axa 3, DMI 3.2 - Infrastructură socială - proiecte finalizate



Parteneriatul dintre Comuna Sanpaul și Asociația Caritas-Asistență socială Filiala Organizației Caritas Alba Iulia
- Înființarea unui nou centru social pentru persoane vârstnice în satul Valea Izvoarelor, comuna Sânpaul, județul Mureș



Municipiul Săcele, jud. Brașov - Reabilitare clădire centru de zi pentru copii aflați în situații de risc

Axa 3, DMI 3.2 - Infrastructură socială - proiecte finalizate



Consiliul Județean Alba - Servicii integrate pentru persoanele cu nevoi speciale Alba



DGASP Mureș - Extinderea și dotarea Centrului de recuperare și reabilitare Europsihiatrică Brâncovenești



Asociația Amicus, jud. Mureș - Extinderea cămin de bătrâni



Municipiul Tîrgu Mureș - Modernizarea căminului pentru vârstnici

Axa 3, DMI 3.2 - Infrastructură socială - proiecte finalizate



Axa 3, DMI 3.3 - Intervenții în situații de urgență

- **Alocat** - 10,31 milioane Euro (8,95 milioane Euro din FEDR)
- **Depuse:** 3 proiecte - 12,06 mil. Euro - 116,97% din care:
 - **Contractate:** 3 proiecte - 12,06 mil. Euro - 116,97%
- **Sume plătite:**
 - Prefinanțare: 1,40 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 10,15 mil. Euro - 98,45%
- **Finalizate** - 2 proiecte - 10,15 mil. Euro
- **Prin proiectele contractate, se vor realiza următorii indicatori:**
 - ✓ 1 centru de comandă și control complet echipat;
 - ✓ 90 de unități mobile ISU dotate cu echipamente și autospeciale.

Axa 3, DMI 3.3 - Intervenții în situații de urgență - proiecte finalizate



ADI Centrul Transilvaniei -
Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor
în situații de urgență

Axa 3, DMI 3.4 - Infrastructură educațională

- **Alocat** - 28,86 milioane Euro (25,03 milioane Euro din FEDR)
- **Depuse:** 104 proiecte - 121,17 mil. Euro - 419,85%, din care:
 - **Contractate:** 29 proiecte - 37,10 mil. Euro - 128,55%
 - **Lista de rezervă:** 52 proiecte - 58,63 mil. Euro
- **Sume plătite:**
 - Prefinanțare: 5,52 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 19,66 mil. Euro - 68,12%
- **Finalizate** - 23 proiecte - tehnic și financiar - 17,73 mil. Euro
 - - 1 proiect finalizat tehnic

DMI 3.4 - apel 2014

- **Alocat** - 18,85 milioane Euro (16,35 milioane Euro din FEDR)
- **Depuse:** 59 proiecte - 31,31 mil. Euro - 166,10%, din care:
 - **Contractate:** 38 proiecte - 16,22 mil. Euro - 86,05%
- **Sume plătite:**
 - Prefinanțare: 0 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 0,44 mil. Euro - 2,33%

Axa 3, DMI 3.4 - Infrastructură educațională

▪ *Prin proiectele contractate, se vor realiza următorii indicatori:*

- ✓ 79 unități de învățământ reabilite;
- ✓ Peste 25.000 elevi care beneficiază de infrastructura reabilitată.



Orașul Întorsura Buzăului - Reabilitare, modernizare și extindere Liceul teoretic “Mircea Eliade”

Axa 3, DMI 3.4 - Infrastructură educațională - proiecte finalizate



Axa 3, DMI 3.4 - Infrastructură educațională - proiecte finalizate



Municipiul Brașov - Reabilitare, dezvoltare și modernizare campus pentru învățământul profesional și tehnic Colegiul Tehnic Remus Răduleț



Municipiul Sfântu Gheorghe - Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor Liceului Teoretic Szekely Miko



Orașul Râșnov, jud. Brașov - Extindere Școală Generală nr. 2 Râșnov



Comuna Joseni, jud. Harghita - Consolidare, reabilitare, extindere și dotare Grupul Școlar Sövény Elek, sat Joseni, comuna Joseni, jud. Harghita

Axa 4, DMI 4.1 - Infrastructură de afaceri

- **Alocat** - 30,91 milioane Euro (27,64 milioane Euro din FEDR)
- **Depuse:** 31 proiecte - 116,98 mil. Euro - 378,45%, din care:
 - **Contractate:** 9 proiecte - 35,51 mil. Euro - 114,88%
- **Sume plătite:**
 - Prefinanțare: 1,83 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 22,87 mil. Euro - 73,99%
 - Proiecte reziliate: 1 proiect - 7,96 milioane Euro
- **Finalizate** - 6 proiecte - tehnic și financiar - 20,72 mil. Euro

- *Prin proiectele contractate, se vor realiza următorii indicatori:*
 - ✓ **7 centre de afaceri construite;**
 - ✓ **1 incubator de afaceri creat;**
 - ✓ **1 parc logistic creat;**
 - ✓ **1305 noi locuri de muncă create în cadrul firmelor localizate în structurile de afaceri.**

Axa 4, DMI 4.1 - Infrastructură de afaceri - proiecte finalizate



SC Transcar Internațional SRL - Centru de afaceri Sibiu

Axa 4, DMI 4.1 - Infrastructură de afaceri - proiecte finalizate



S.C. TRANSCAR INTERNAȚIONAL S.R.L - Centru de afaceri
Sibiu



S.C. ROMEX S.R.L Tîrgu Mureș - Înființare centru de
afaceri de către SC Romex SRL



Axa 4, DMI 4.1 - Infrastructură de afaceri - proiecte finalizate



S.C. KELLER STEAK HOUSE S.R.L.- ICE LOGISTIC PARC. Proiect de realizare a unei structuri de sprijinire a afacerilor din domeniul alimentar prin construirea unei hale frigorifice P+2E și spații de birouri în județul Brașov, orașul Ghimbav, zona Transilvana

Axa 4, DMI 4.2 - Reabilitare situri industriale

- **Alocat** - 6,09 milioane Euro (5,45 milioane Euro din FEDR)
- **Depuse:** 5 proiecte - 10,70 mil. Euro - 175,70%, din care:
 - **Contractate:** 4 proiecte - 7,40 mil. Euro - 121,51%
- **Sume plătite:**
 - Prefinanțare: 0,03 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 2,05 mil. Euro - 33,66%
- **Prin proiectele contractate, se vor realiza următorii indicatori:**
 - ✓ o fostă fabrică de prelucrare a lemnului transformată în centru de afaceri;
 - ✓ un fost Centru de Protecție a Plantelor transformat în centru de afaceri;
 - ✓ un vechi IAS transformat într-un parc industrial;
 - ✓ o stație de epurare abandonată transformată într-o zonă economică modernă;
 - ✓ 644 noi locuri de muncă create.

Axa 4, DMI 4.3 - Sprijinirea microîntreprinderilor

- **Alocat** - 22,55 milioane Euro (20,16 milioane Euro din FEDR)
- **Depuse:** 668 proiecte - 79,55 mil. Euro - 352,77%, din care:
 - **Contractate:** 248 proiecte - 28,09 mil. Euro - 124,57%
- **Sume plătite:**
 - Prefinanțare: 1,05 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 22,03 mil. Euro - 97,69%
- **Proiecte reziliate:**
 - 45 proiecte cu o valoare a sumei solicitate de 4,76 milioane Euro
- **Finalizate:**
 - 192 de proiecte având o valoare de 20,91 mil. Euro
- **Prin proiectele contractate, se vor realiza următorii indicatori:**
 - ✓ 203 microîntreprinderi modernizate;
 - ✓ 850 locuri de muncă nou create.

Axa 4, DMI 4.3 - Sprijinirea microîntreprinderilor - proiecte finalizate



Beneficiar: SC SOLVOSIB SRL,
Mun. Sibiu, Jud. Sibiu



Beneficiar: SC Pastel Graph Serv SRL,
Oraş Ungheni, Jud. Mureş



Beneficiar: SC Revopack SRL
Mun. Braşov, Jud. Braşov



Beneficiar: SC Salinae SRL
Orasş Ocna Mureş, Jud. Alba

Axa 4, DMI 4.3 - Sprijinirea microîntreprinderilor - proiecte finalizate



Axa 5, DMI 5.1 - Reabilitare obiective de patrimoniu

- **Alocat** - 25,30 milioane Euro (23,35 milioane Euro din FEDR)
- **Depuse:** 33 proiecte - 92,51 mil. Euro - 365,65%, din care:
 - **Contractate:** 8 proiecte - 32,19 mil. Euro - 127,23%
 - **Lista de rezervă:** 14 proiecte - 37,62 mil. Euro
- **Sume plătite:**
 - Prefinanțare: 5,72 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 19,78 mil. Euro - 78,18%
- **Proiecte finalizate** - 5 proiecte finalizate și tehnic și financiar - 16,82 mil. Euro

- *Prin proiectele contractate, se vor realiza următorii indicatori:*
 - ✓ 4 cetăți obiectiv de patrimoniu reabilitate din Alba Iulia, Rupea, Tîrgu Mureș, Mediaș;
 - ✓ 18 biserici fortificate restaurate și introduse în circuitul turistic din județele Alba, Brașov, Sibiu și Mureș;
 - ✓ 1 biserică evanghelică obiectiv de patrimoniu din municipiul Sibiu, reabilitată.
 - ✓ modernizarea Muzeului Civilizației Populare Tradiționale din Dumbrava Sibiului.
 - ✓ centrul istoric Agnita reabilitat.
 - ✓ 123 de noi locuri de muncă create.

Axa 5, DMI 5.1 - Reabilitare obiective de patrimoniu - proiecte finalizate



Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice CA din România -
Tezaure Fortificate Redescoperite - Dezvoltarea durabilă a
Regiunii Centru prin punerea în valoare a potențialului turistic al
rețelei de biserici fortificate săsești din Transilvania



Județul Sibiu- Crearea și modernizarea infrastructurii de
valorificare turistică a patrimoniului cultural al Muzeului
Civilizației Populare Tradiționale din Dumbrava Sibiului



Axa 5, DMI 5.1 - Reabilitare obiective de patrimoniu - proiecte finalizate



Municipiul Alba Iulia - Reabilitare Centru Istoric Traseul Estic, Traseul Sudic, Traseul Nordic Fortificația de tip Vauban - Alba Iulia - cai de acces, iluminat și mobilier urban specific



Orașul Rupea - Reabilitarea și extinderea infrastructurii turistice în orașul Rupea



Axa 5, DMI 5.1 - Reabilitare obiective de patrimoniu - proiecte finalizate



Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice CA din România
- Tezaure Fortificate Redescoperite- Dezvoltarea durabilă a regiunii Centru prin punerea în valoare a potențialului turistic al rețelei de biserici fortificate săsești din Transilvania



Parohia Evanghelică C.A. Sibiu
- Conservarea, protejarea și punerea în valoare a monumentului patrimoniu național Biserica Evanghelică CA Sibiu prin restaurarea acoperișului clădirii



Axa 5, DMI 5.2 - Infrastructură de turism

- **Alocat** - 37,28 milioane Euro (34,38 milioane Euro din FEDR)
- **Depuse**: 87 proiecte - 118,40 mil. Euro - 317,60%, din care:
 - **Contractate**: 27 proiecte - 41,71 mil. Euro - 118,88%
- **Sume plătite**:
 - Prefinanțare: 3,20 mil. Euro
 - Rambursare FEDR + BS + pref. dedusă: 18,97 mil. Euro - 50,89%
- Proiecte reziliate: 2 proiecte - 1,15 milioane Euro
- **Finalizate** - 11 proiecte - tehnic și financiar - 11,55 mil. Euro
 - 1 proiect finalizat tehnic

- *Prin proiectele contractate, se vor realiza următorii indicatori:*
 - ✓ 4 stațiuni turistice reabilite din Șugaș Băi, Harghita Băi, Biborțeni-Baraolt și Borsec;
 - ✓ 10 unități de cazare modernizate;
 - ✓ 3 puncte salvamont construite și 1 punct salvamont reabilitat în județul Harghita;
 - ✓ 13 structuri de agrement
 - ✓ 1 pârtie de schi construită în localitatea Jina, Sibiu;
 - ✓ 4 parcuri amenajate în municipiul Alba Iulia, în stațiunea Sovata, în municipiul Tîrgu Mureș și lângă Râșnov;
 - ✓ 424 locuri de muncă create.

Axa 5, DMI 5.2 - Infrastructură de turism - proiecte finalizate



Municipiul Sfântu Gheorghe- Crearea și modernizarea infrastructurii de agrement Șugaș Băi, municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna -utilități publice private



SC Grand SA, Tîrgu Mureș
- Modernizare și extindere HOTEL GRAND - Tîrgu Mureș



SC Parc SA, Alba Iulia - Reabilitare corp vechi - lucrări de finisaje exterioare și dotare cu utilaje



SC Imam Consult SRL, Râșnov, jud. Brașov - Investiții în infrastructura de agrement a Complexului Turistic Ferma Pănicel

Axa 5, DMI 5.2 - Infrastructură de turism - proiecte finalizate



SC MADISON COMPANY SRL, Braşov - Dezvoltarea calităţii serviciilor turistice prin extinderea capacităţii de cazare şi modernizarea Hotelului Oliver din cadrul SC Madison Company SRL



SC PĂLTINIŞ SA, Sibiu - Modernizare şi extindere hotel Casa Turiştilor



Probleme întâlnite în procesul de implementare a proiectelor în cadrul POR 2007-2013 și măsuri / propuneri de soluționare a acestora

Gradul de contractare:

- Suma alocată: 480,61 milioane € FEDR + BS
- Suma contractată: 592,07 milioane €
- Teoretic gradul de contractare: 123,19%
- Din analiza situației existente la 31.05.2015, rezultă un grad de contractare de 98,58%


Gradul de contractare la nivelul Regiunii Centru

ADR Centru a întreprins o serie de demersuri către AM POR, în vederea aprobării supracontractării proiectelor aflate în listele de rezervă:

- au fost întocmite situații cuprinzând stadiul contractării și implementării proiectelor, din care a rezultat valoarea actualizată a contractelor de finanțare, ținând cont de valoarea contractelor de achiziție, a corecțiilor aplicate și contractelor reziliate
- în cazurile în care au fost constatate sume disponibile în cadrul fiecărui DMI față de sumele alocate, au fost transmise la AMPOR solicitări pentru continuarea procesului de evaluare, selecție și contractare pentru cereri de finanțare aflate în lista de rezervă aferenta fiecărui DMI
- astfel, au fost semnate contracte de finanțare, după cum urmează: pentru DMI 1.1 – 1 contract, pentru DMI 2.1. - 6 contracte, pentru DMI 3.1.- 6 contracte, pentru DMI 3.2.- 4 contracte, pentru DMI 3.4.- 6 contracte, pentru DMI 5.1- 3 contracte

Gradul de absorbție la nivelul Regiunii Centru

Gradul de absorbție la nivelul Regiunii Centru pentru POR este de **62,27%**.

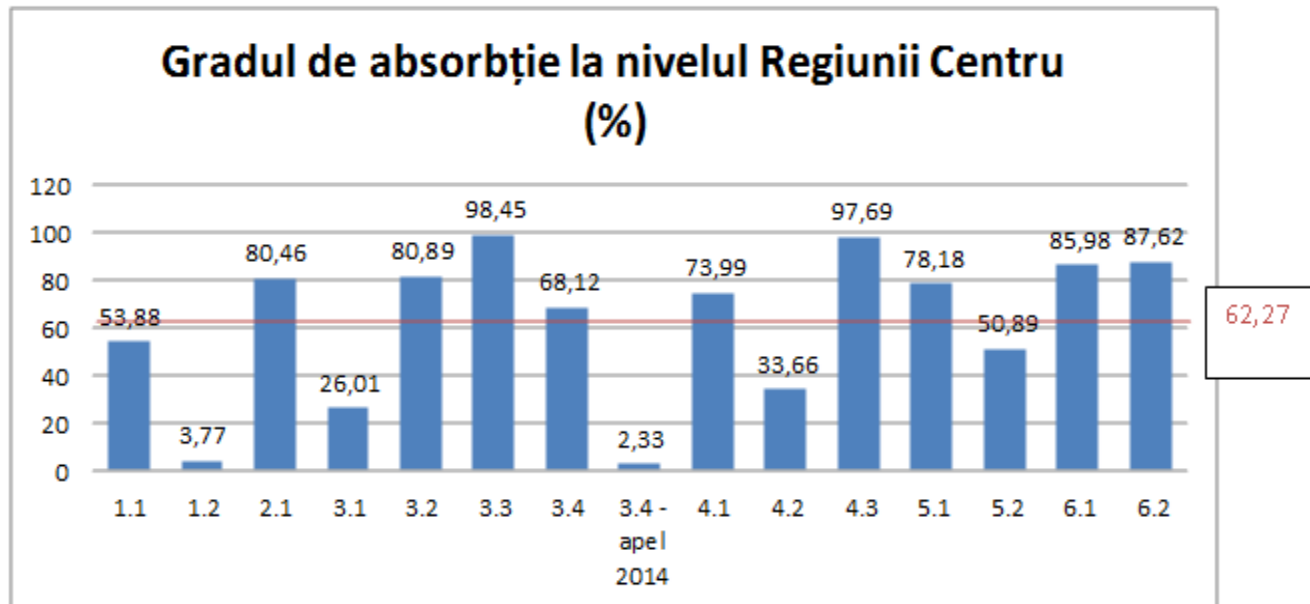

Principalele probleme identificate la proiectele aflate în implementare sunt:

- întârzieri în derularea procedurilor de achiziții și încheierea contractelor
- modificări ale proiectelor tehnice, datorate neconcordanțelor cu realitatea din teren
- întârzieri în execuție, datorate neînțelegerilor dintre firma de construcții și proiectant, respectiv beneficiar
- executantul lucrării se află în procedura de insolvență sau faliment
- întârzieri în depunerea CR/CP, datorită întârzierilor în depunerea facturilor la beneficiari

Situația proiectelor aflate în implementare :

DMI 1.1. - din 20 proiecte în implementare, 19 proiecte au valoarea peste 5.000.000 lei, din care 9 au gradul de absorbție între 0-5% astfel:

- Sibiu - 1 proiect
- Brașov - 6 proiecte
- Mureș - 1 proiect
- Covasna - 1 proiect

DMI 1.2. – din 13 proiecte în implementare, 2 proiecte au valoarea peste 5.000.000 lei, din care 2 au gradul de absorbție între 0-5% astfel:

- Harghita – 1 proiect
- Mureș - 1 proiect

Situația proiectelor aflate în implementare :

DMI 2.1.- din 9 proiecte în implementare, toate au valoarea peste 5.000.000 lei, din care 1 proiect are gradul de absorbție între 0-5%, astfel:

- Mureș - 1 proiect

DMI 3.1. - din 6 proiecte în implementare, 3 proiecte au valoarea peste 5.000.000 lei, din care 2 având gradul de absorbție între 0-5%, astfel:

- Mureș - 2 proiecte

DMI 3.2. - din 4 proiecte în implementare nici unul nu are valoarea peste 5.000.000 lei.

Situația proiectelor aflate în implementare :

DMI 3.4. - din 43 proiecte în implementare, 6 proiecte au valoarea peste 5.000.000 lei, din care 4 proiecte au gradul de absorbție între 0-5%, astfel:

- Covasna - 2 proiecte
- Harghita - 1 proiect
- Alba - 1 proiect

DMI 4.1. - din 2 proiecte în implementare, ambele au valoarea peste 5.000.000 lei, 1 proiect are gradul de absorbție între 0-5% astfel:

- Sibiu - 1 proiect

DMI 4.2. - din 8 proiecte în implementare, 2 proiecte au valoarea peste 5.000.000 lei, 1 proiect are gradul de absorbție între 0-5% astfel:

- Covasna - 1 proiect

Situația proiectelor aflate în implementare :

DMI 5.1.- din 3 proiecte în implementare, 1 proiect are valoarea peste 5.000.000 lei si gradul de absorbție între 0-5% astfel:

- Sibiu - 1 proiect

DMI 5.2. - din 13 proiecte în implementare, 10 proiecte au valoarea peste 5.000.000 lei, din care 3 proiecte au gradul de absorbție între 0-5%, astfel:

- Covasna -1 proiect
- Mureș - 1 proiect
- Sibiu - 1 proiect

Măsuri întreprinse:

- Analiza punctuală pe proiectele cu probleme în cadrul întâlnirilor organizate cu ofițerii de monitorizare si ofițerii financiari;
- Planificare de vizite speciale la sediul beneficiarului si la locul de implementare a proiectelor la care au fost invitați să participe și reprezentanții AMPOR, ai constructorului, dirigintele de șantier, proiectantul, managerul de proiect;
- Planificare de întâlniri la sediul ADR Centru sau AM POR cu echipele implicate în derularea proiectelor cu probleme;
- Scrisori de atenționare privind termenele de finalizarea a proiectelor conform Instrucțiunii 134/22.05.2015 privind termenele limita de depunere a Cererilor de rambursare si a Cererilor de plata in vederea închiderii Programului Operational Regional 2007-2013;
- În următoarea perioadă se vor solicita graficele de rambursare actualizate în funcție de graficele de execuție a lucrărilor pentru o estimare a sumelor ce urmează a fi solicitate la decontare lunar de către beneficiari.

Propuneri de elaborare a unei proceduri speciale si de înființare de complete judecătorești specializate, de imbunatatire a legislatiei privind achizitiile publice si a HG 28/2008:

Inființare de complete judecătorești specializate și stabilirea unei proceduri speciale cu termene reduse pentru soluționarea litigiilor născute în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene:

- formulate prin Scrisoarea CDR Centru nr. 1/27.03.2015, înaintată Prim – Ministrului Guvernului României, Ministrului Fondurilor Europene și Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
- răspuns a formulat doar Ministerul Fondurilor Europene (scrisoarea nr. 19/07.04.2015, înregistrată la ADR Centru sub nr. 10444/07.04.2015 și la CDR Centru sub nr. 2/07.04.2015), fără însă a aborda problema completelor specializate și a procedurii speciale de soluționare a litigiilor realizate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene

Propuneri privind modificarea sistemului achizițiilor publice:

- ADR Centru a cerut sprijinul consiliilor județene și primăriilor municipiilor reședință de județ cu privire la problemele întâmpinate și propunerile de îmbunătățire a sistemului achizițiilor publice
- răspunsurile primite (de la 6 autorități publice) și propunerile ADR Centru au făcut obiectul unei scrisori adresată Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene și Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
- scrisoarea a fost postată și pe forumul agențiilor pentru dezvoltare regională

Propuneri de modificare a HG nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții:

- în cursul lunilor aprilie-mai 2015 a fost solicitat sprijinul consiliilor județene și primăriilor municipiilor reședință de județ cu privire la propuneri de modificare a HG nr. 28/2008, pentru a putea fi promovate într-o viitoare modificare legislativă
- au fost primite 3 scrisori din partea autorităților publice locale
- cele 3 scrisori au fost comunicate celorlalte regiuni de dezvoltare regională pentru completare, urmând ca scrisoarea comună să fie transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Vă mulțumim!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Tel: 0258/818616

Fax: 0258/818613

email: office@adrcentru.ro

web: www.regio-adrcentru.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
